



SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Delgivningsätt: Anslås: ☒ Personlig kvittens: ☐
Informationsförvaltare: Valentin Bjurulf, Subvenio tel. 072-226 33 40
Granskad av: Hans Höwitz
Fastställd av: Harald Schaffhauser
Gäller fr.o.m: 2021-11-15
Gäller t.o.m: 2021-11-19
Ärendenr: TN 2014-0594
Tillämpningsområde: Tunnelbana 3
Till: Berörda avdelnings-, sektions- och gruppchefer inom TF.
Berörda entreprenörer.
All Personal med behörighet enligt Tri Tub

Arbeten med brandluckor KTG-TCE

Bakgrund

Arbetet går ut på att reparera brandluckor som är belägna i taket i genomslaget mellan norr- och söderspår. Då brandluckorna fyller en viktig säkerhetsmässig funktion i samband med brand och rökutveckling är det viktigt att de fungerar i samband med en nödsituation.

Arbetet kommer att utföras av personer utan Tri-behörighet men med betryggande avstånd från säkerhetszonen och avskärmning av denna. Även om ställningen eller det avgränsande staketet av någon anledning skulle rasa så ska detta sättas upp på betryggande avstånd. Utöver den väg, mellan plattform och arbetsplats, som personalen behöver lotsas kommer varken tågtrafik, bana eller strömskena således att påverkas av arbetet.

Syfte

Syftet med detta säkerhetsmeddelande är att informera personal i säkerhetstjänst om det arbete som kommer att pågå under perioden måndag – fredag vecka 46. Arbetet kommer att utföras på en avgränsad plats mellan Kungsträdgården och T-centralen.

Tillämpning (personal utan Tri-behörighet)

Arbetsplatsen som är belägen i mellanslaget strax söder om TCE kommer att inhägnas med kravallstaket. Vid inpassage ansvarar Tsm för att informera TLC 3 om att personal utan behörighet enligt Tri Tub, kat 19. kommer att lotsas till arbetsplatsen av denne. Tsm lotsar därefter personalen mellan plattform 5 i T-centralen och arbetsplatsen. Personalen lotsas söderut, längs norrgående spår, i riktning mot Kungsträdgården.

I syfte att inte störa tågtrafiken samt för att säkerställa att säkerheten upprätthålls på arbetsplatsen kommer två (2) Tsm att närvara och tjänstgöra på arbetsplatsen samt övervaka detta.

Omfattning

Arbetet avgränsas genom att arbetsplatsen inhägnas med kravallstaket på ömse sidor. Avståndet mellan inhägnadens ytterkanter och säkerhetszonen kommer att uppgå till 5 meter. Arbetet kommer att omfatta olika delmoment under vecka 46.

- Dessa delmoment utgörs av:
- Uppbyggnad av ställning
 - Besiktning av ställning
 - Reparation och underhåll av brandlucka
 - Demontering av ställning
 - Återställning av platsen

Harald Schaffhauser
Stf Säkerhetsdirektör
Trafikförvaltningen

SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Bilder



Arbetsplatsområde.



Röklucka.




Transportsträcka till plattform.



Km-märke vid arbetsplats, 0+7.

SÄKERHETSMEDDELANDE (SM)

Skiss

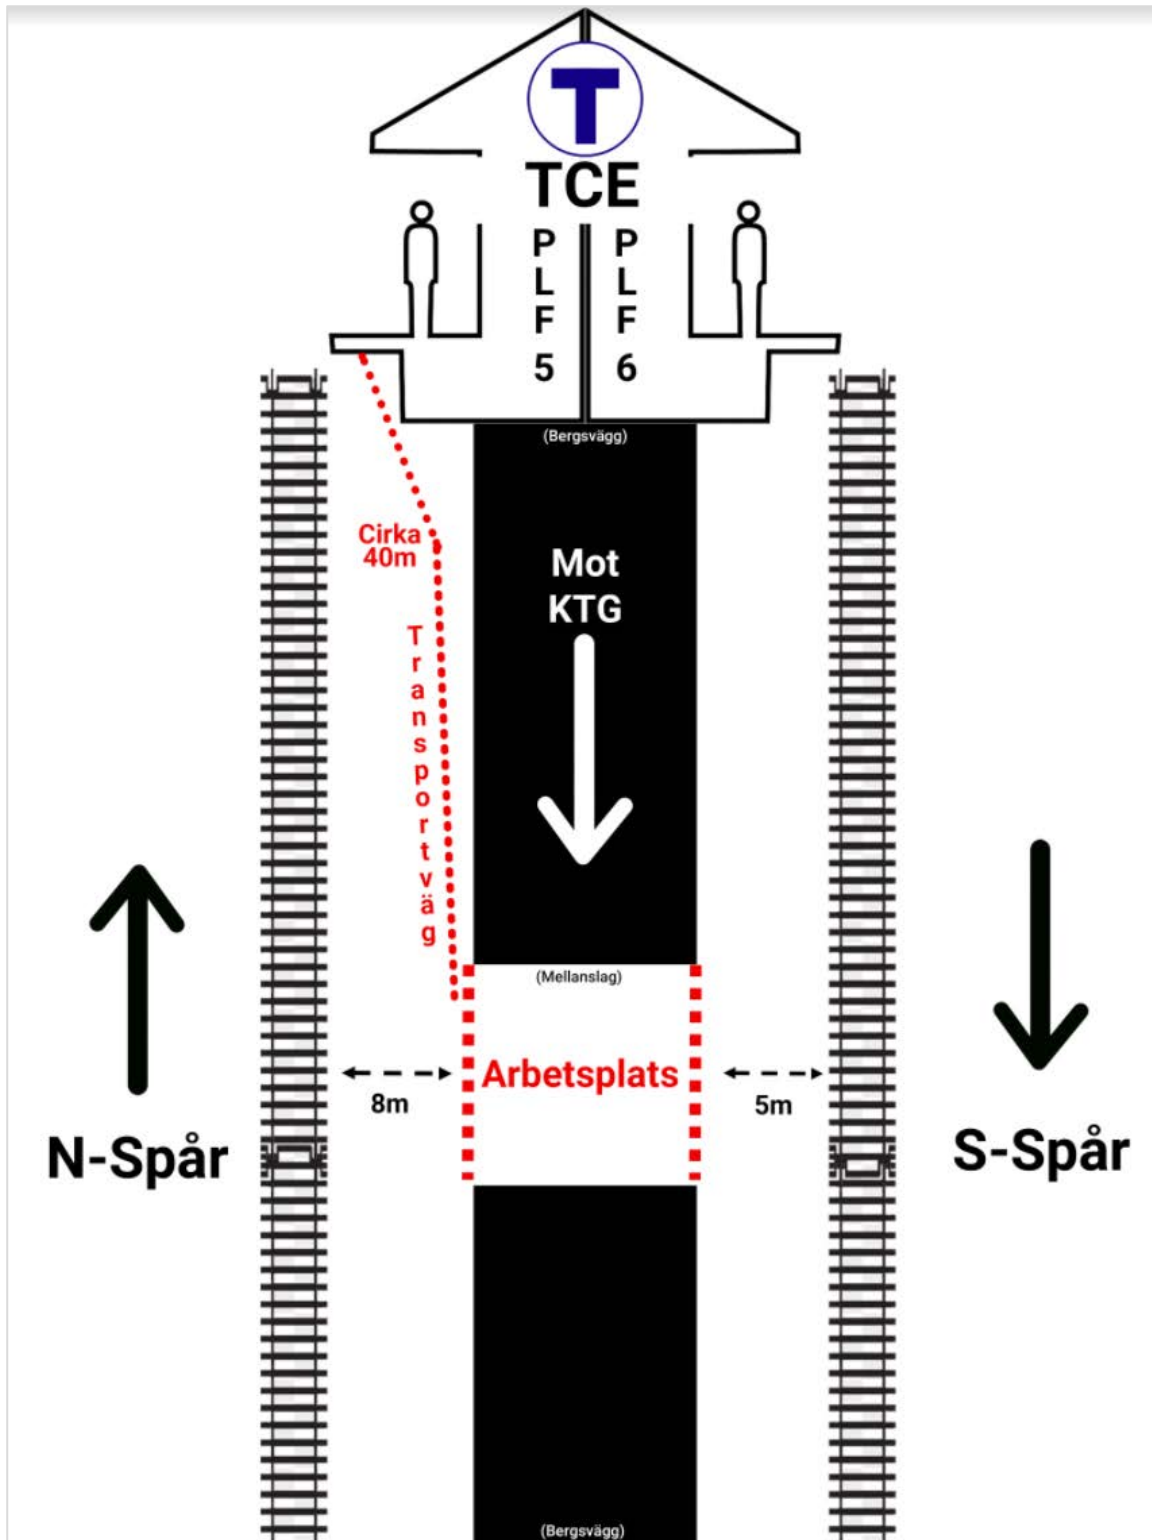

Skiss över arbetsplats och den väg som personal kommer att lotsas.
